



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA**  
**JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-007-2022**  
**REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES GENERALES**  
**PARA LA CASA DE JUSTICIA Y CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE CHIGNAHUAPAN.**

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2022, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NÚMERO 11921 EN LA COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE EL **C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE; **C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ**, VOCAL; **C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ**, VOCAL; ASÍ COMO EL **C. ERASMO PEDRAZA CASTILLO**, ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES COMO **UNIDAD SOLICITANTE** SE ENCUENTRA PRESENTE EL **C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ**; A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN A LA **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DICEN CONTENER LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL **CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-007-2022**. ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 4, 15 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN IV, 63 FRACCIÓN I, 74 Y 99 FRACCIONES I, IV, V Y VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL; 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105, 106 Y 109 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 49 NUMERAL 1 APARTADO H, DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV. 1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y PUNTOS 1.7, 2, 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DEL MENCIONADO CONCURSO.-----

**HECHOS**

- 1.- SE DA INICIO A ESTE ACTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.-----
- 2.- POSTERIORMENTE, SE CONTINUÓ CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.-----
- 3.- ACTO SEGUIDO, SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES DE LOS LICITANTES: **ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V., EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SEIBEN LANDER, S.A. DE C.V.**, MISMOS QUE DICEN CONTENER LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADA EN LAS BASES DEL CONCURSO QUE NOS OCUPA.

EN UN PRIMER MOMENTO, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE UNO, QUE DEBE CONTENER LOS REQUISITOS LEGALES, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 2 DE LAS BASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO QUE EN ESA ETAPA SE DESAHOGA HAYA SIDO DEBIDAMENTE INTEGRADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES; PARA QUE, UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A UNA PRIMERA REVISIÓN LEGAL CUANTITATIVA, SE CONTINUÓ CON LA APERTURA DE LOS SOBRES DOS Y TRES DE LOS PARTICIPANTES, QUE DICEN CONTENER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO; DEL MISMO MODO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE RECIBEN PARA REALIZARLES UNA PRIMERA REVISIÓN CUANTITATIVA.-----



EN LA PRESENTE ACTA, SE PLASMAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RECIBIDAS, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE SIEMPRE PREVALECERÁN LAS PROPUESTAS IMPRESAS SOBRE LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS INCLUIDAS EN LOS SOBRES.-----

LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES:-----

LICITANTE: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
1	6.00	Pza	Suministro e instalación de mingitorio, incluye tubería hidráulica, descarga sanitaria, válvula temporizadora de agua, ranuras necesarias y adecuación de descarga sanitaria, y corrección de muro existente, tornillería, materiales, mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
2	29.00	Pza	Suministro y colocación de tapa y asiento para wc línea pesada en color blanco antiséptica y anti hongos. Incluye mano de obra herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
3	1.00	Serv.	Suministro y colocación de bomba sumergible de 1 hp para alimentación de tinacos en centro de convivencia incluye línea de alimentación para tinacos, en tubería hidráulica de pp-r de 1"1/4", herramienta, equipo, mano de obra.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
4	148.00	MI	Instalación de línea de alimentación de agua potable a casa de justicia, en tubería hidráulica de de pp - r de 1"1/4" incluye herramienta mano de obra, conexiones, equipo y todo lo necesario para un buen trabajo	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
5	2.00	Serv.	Modificaciones a trayectorias hidráulicas existentes, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para un buen funcionamiento, ranurados correcciones de muros o plafones, con sus respectivos procedimientos para un adecuado trabajo, equipo, herramienta. Etc.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
6	1.00	Salida	Suministro e instalación de línea hidráulica para riego de jardinería y incluye tubería de 3/4" válvula de nariz, conexiones, soportaría manguera de 50 ml y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
7	17.00	Pza	Suministro e instalación de lavabo con pedestal en color blanco, incluye, ranuras necesarias para adecuación de descarga sanitaria, mezcladora de agua cespól. Materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
8	3.00	Pza	Suministro y colocación de wc en color blanco modelo terracota incluye herrajes, juntas y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
9	16.00	Pza	Suministro y colocación de herrajes para tanque de wc corrección, incluye desmontaje y montaje de tanque, así como adecuada fijación de inodoro, con materiales de fijación adecuados, materiales y mano de obra.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
10	9.00	Pza	Suministro y colocación de mezcladora modelo similar al existente incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
11	1.00	Pza	Suministro y adecuación de línea de llenado de cisterna a tinacos del centro de convivencia, incluye, válvulas flotador maniobras en piso corrección de fuga de agua, maniobra de piso y todo lo necesario para su adecuada corrección.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
12	96.00	MI	Suministro, tendido, colocación y adecuación de tubería de 8" en polietileno de alta densidad (PEAD)	A partir del siguiente día hábil de formalización	Durante la vigencia del contrato defectos y



LICITANTE: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
			corrugado con doble pared, bajo norma AASHTO, para descargas de agua pluvial incluye inserciones de 4", acarreo y maniobras necesarias para un adecuada instalación.	del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	vicios ocultos.
13	2,730.00	M2	Limpieza general del lugar durante el tiempo que se ejecuten los trabajos y al finalizar los mismos.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
<b>Bloque 2.- Cancelería de aluminio</b>					
14	104.43	M2	Adecuación de muro de tabla roca, corte y corrección, incluye, el suministro de materiales, perfiles acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, y lo necesario para un adecuado trabajo.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
15	45.00	M2	Suministro y colocación de falso plafón en tabla roca incluye materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
16	27.00	ML	Suministro y colocación de relleno para corrección de pisos en trayectorias de recorte de muros falsos, incluye materiales, herramienta, aditivos, acarreo y todo lo necesario para su buena colocación	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
17	4,237.50	M2	Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable en muros y plafones incluye equipo herramienta mano de obra y todo lo necesario	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
18	247.89	ML	Reparación de falso plafón a base de tabla roca en uniones y traslapes que fue retirado para el montaje de líneas eléctricas y de datos para instalaciones especiales. Incluye materiales mano de obra, incluye herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su corrección.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
19	5.04	M2	Retiro de cancelería de madera de 2.10 incluye desmontaje de marcos, chambranas y corrección de de muro, herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
20	25.35	M2	Suministro y habilitado de refuerzos en cancelería de aluminio de 3" con perfiles de aluminio de 3", incluye desmontaje de la cristalería y cancelería existente, recorte de cristales, y reinstalación de la cancelería modificada, viniles, felpas, incluye maniobras, herramienta equipo y todo lo necesario para garantizar la estabilidad del cancel.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
21	9.87	M2	Suministro y colocación de ventana para atención al público en aluminio blanco de 3" vidrio claro de 6 mm, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye una corredera y fijo a lo ancho de espacio, con 20 cm libres en diferentes medidas a una altura de 1.10 metros (4 piezas )	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
22	59.00	M2	Suministro y colocación de fijos en aluminio blanco en tres pulgadas con vidrio de 6 milímetros, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye material, herramienta y equipo. Diferentes medidas	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
23	30.55	M2	Suministro y colocación de puertas con pivote chapa en aluminio blanco en 3 pulgadas, vidrio claro de 6 mm, incluye herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (módulos de puertas en diferentes medidas)	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
24	5.00	SERV	Suministro y habilitado de refuerzo para puertas, a base de perfiles ligeros de acero al carbón, para soporte de cancelería de aluminio, incluye ranurado de falso plafón, corrección de falso plafón, equipo,	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.



LICITANTE: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
			herramienta maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		
25	154.10	ML	Suministro y colocación de película satinada sobre vidrio por lo ancho del cancel con un desarrollo de 20 centímetros de ancho, incluye materiales, equipo mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
26	23.00	SAL	Suministro y adecuación de salida eléctrica existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
27	8.00	SAL	Suministro y adecuación de salida de voz y datos existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
28	10.00	SAL	Suministro, instalación y colocación de contactos regulados a 110 v incluye ducto, cableado, con un desarrollo de 15 ml, herraje y equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
29	11.00	SAL	Suministro, y colocación de apagador especial para cancelería incluye conexión, revisión de circuito instalación, herramienta mano de obra equipo y todo lo necesario para una buena ejecución	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
30	3.00	SAL	Suministro y colocación de tierra física para aterrizar proceso de site, incluye conexiones, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una correcta ejecución, sin intervenir en el proceso de funcionamiento y proceso del site.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
31	4.00	SERV.	Acarreos, y retiro de desechos, productos de limpieza etc. Incluye mano de obra y materiales.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
<b>Bloque 3.- Zoclos</b>					
32	1,827.87	ML	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm color negro con adhesivo de alta resistencia incluye, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su colocación	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
33	408.30	ML	Suministro, junteado y corrección de fisuras en muros de mampostería a base de materiales finos, incluye apertura, limpieza y aplicación de material de sellado, herramienta, equipo y mano de obra	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
34	937.35	ML	Suministro, y junteo de sellador elástica en color blanco a base de polímeros, grado arquitectónico para juntar muros con piso de cerámica. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
35	765.50	ML	Suministro, y junteo con pasta en color blanco a base de polímeros y resinas, para juntar muros con plafones. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
<b>Bloque 4.- Reja exterior</b>					
36	172.26	ML	Suministro y colocación de reja acero en color blanco a una altura de 2.50 mts incluye postes de reja-acero, abrazaderas paneles de reja-acero de 2.50 x 2.50 metros, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
37	2.00	PZA	Suministro y colocación de portón de reja-acero de 3.57 metros lineales a 2.50 metros de altura, incluye materiales mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.



EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
1	6	Pza	Suministro e instalación de mingitorio, incluye tubería hidráulica, descarga sanitaria, válvula temporizadora de agua, ranuras necesarias y adecuación de descarga sanitaria, y corrección de muro existente, tornillería, materiales, mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
2	29	Pza	Suministro y colocación de tapa y asiento para wc línea pesada en color blanco antiséptica y anti hongos. Incluye mano de obra herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
3	1	Serv.	Suministro y colocación de bomba sumergible de 1 hp para alimentación de tinacos en centro de convivencia incluye línea de alimentación para tinacos, en tubería hidráulica de pp-r de 1"1/4", herramienta, equipo, mano de obra.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
4	148	MI	Instalación de línea de alimentación de agua potable a casa de justicia, en tubería hidráulica de de pp - r de 1"1/4" incluye herramienta mano de obra, conexiones, equipo y todo lo necesario para un buen trabajo	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
5	2	Serv.	Modificaciones a trayectorias hidráulicas existentes, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para un buen funcionamiento, ranurados correcciones de muros o plafones, con sus respectivos procedimientos para un adecuado trabajo, equipo, herramienta. Etc.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
6	1	Salida	Suministro e instalación de línea hidráulica para riego de jardinería y incluye tubería de 3/4" válvula de nariz, conexiones, soportaría manguera de 50 ml y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
7	17	Pza	Suministro e instalación de lavabo con pedestal en color blanco, incluye, ranuras necesarias para adecuación de descarga sanitaria, mezcladora de agua cespól. Materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
8	3	Pza	Suministro y colocación de wc en color blanco modelo terracota incluye herrajes, juntas y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
9	16	Pza	Suministro y colocación de herrajes para tanque de wc corrección, incluye desmontaje y montaje de tanque, así como adecuada fijación de inodoro, con materiales de fijación adecuados, materiales y mano de obra.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
10	9	Pza	Suministro y colocación de mezcladora modelo similar al existente incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
11	1	Pza	Suministro y adecuación de línea de llenado de cisterna a tinacos del centro de convivencia, incluye, válvulas flotador maniobras en piso corrección de fuga de agua, maniobra de piso y todo lo necesario para su adecuada corrección.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
12	96	MI	Suministro, tendido, colocación y adecuación de tubería de	Desde la firma	Durante la



EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
			8" en polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado con doble pared, bajo norma AASHTO, para descargas de agua pluvial incluye inserciones de 4", acarreo y maniobras necesarias para una adecuada instalación.	del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	vigencia del contrato
13	2,730	M2	Limpieza general del lugar durante el tiempo que se ejecuten los trabajos y al finalizar los mismos.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
<b>Bloque 2.- Cancelería de aluminio</b>					
14	104.43	M2	Adecuación de muro de tabla roca, corte y corrección, incluye, el suministro de materiales, perfiles acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, y lo necesario para un adecuado trabajo.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
15	45	M2	Suministro y colocación de falso plafón en tabla roca incluye materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
16	27	ML	Suministro y colocación de relleno para corrección de pisos en trayectorias de recorte de muros falsos, incluye materiales, herramienta, aditivos, acarreo y todo lo necesario para su buena colocación	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
17	4,237.50	M2	Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable en muros y plafones incluye equipo herramienta mano de obra y todo lo necesario	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
18	247.89	ML	Reparación de falso plafón a base de tabla roca en uniones y traslapes que fue retirado para el montaje de líneas eléctricas y de datos para instalaciones especiales. Incluye materiales mano de obra, incluye herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su corrección.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
19	5.04	M2	Retiro de cancelería de madera de 2.10 incluye desmontaje de marcos, chambranas y corrección de de muro, herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
20	25.35	M2	Suministro y habilitado de refuerzos en cancelería de aluminio de 3" con perfiles de aluminio de 3", incluye desmontaje de la cristalería y cancelería existente, recorte de cristales, y reinstalación de la cancelería modificada, viníles, felpas, incluye maniobras, herramienta equipo y todo lo necesario para garantizar la estabilidad del cancel.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
21	9.87	M2	Suministro y colocación de ventana para atención al público en aluminio blanco de 3" vidrio claro de 6 mm, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye una corredera y fijo a lo ancho de espacio, con 20 cm libres en diferentes medidas a una altura de 1.10 metros (4 piezas )	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
22	59	M2	Suministro y colocación de fijos en aluminio blanco en tres pulgadas con vidrio de 6 milímetros, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye material, herramienta y equipo. Diferentes medidas	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
23	30.55	M2	Suministro y colocación de puertas con pivote chapa en aluminio blanco en 3 pulgadas, vidrio claro de 6 mm, incluye	Desde la firma del contrato	Durante la vigencia del



EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
			herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (módulos de puertas en diferentes medidas)	hasta el 11 de mayo del 2022.	contrato
24	5	SERV	Suministro y habilitado de refuerzo para puertas, a base de perfiles ligeros de acero al carbón, para soporte de cancelería de aluminio, incluye ranurado de falso plafón, corrección de falso plafón, equipo, herramienta maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
25	154.10	ML	Suministro y colocación de película satinada sobre vidrio por lo ancho del cancel con un desarrollo de 20 centímetros de ancho, incluye materiales, equipo mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
26	23	SAL	Suministro y adecuación de salida eléctrica existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
27	8	SAL	Suministro y adecuación de salida de voz y datos existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
28	10	SAL	Suministro, instalación y colocación de contactos regulados a 110 v incluye ducto, cableado, con un desarrollo de 15 ml, herraje y equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
29	11	SAL	Suministro, y colocación de apagador especial para cancelería incluye conexión, revisión de circuito instalación, herramienta mano de obra equipo y todo lo necesario para una buena ejecución	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
30	3	SAL	Suministro y colocación de tierra física para aterrizar proceso de site, incluye conexiones, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una correcta ejecución, sin intervenir en el proceso de funcionamiento y proceso del site.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
31	4	SERV.	Acarreos, y retiro de desechos, productos de limpieza etc. Incluye mano de obra y materiales.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
<b>Bloque 3.- Zoclos</b>					
32	1,827.87	ML	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm color negro con adhesivo de alta resistencia incluye, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su colocación	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
33	408.30	ML	Suministro, junteado y corrección de fisuras en muros de mampostería a base de materiales finos, incluye apertura, limpieza y aplicación de material de sellado, herramienta, equipo y mano de obra	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
34	937.35	ML	Suministro, y junteo de sellador elástica en color blanco a base de polímeros, grado arquitectónico para juntar muros con piso de cerámica. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta mano de obra y todo lo necesario	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del	Durante la vigencia del contrato



EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
			para una adecuado trabajo	2022.	
35	765.50	ML	Suministro, y junteo con pasta en color blanco a base de polímeros y resinas, para juntar muros con plafones. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
<b>Bloque 4.- Reja exterior</b>					
36	172.26	ML	Suministro y colocación de reja acero en color blanco a una altura de 2.50 mts incluye postes de reja-acero, abrazaderas paneles de reja-acero de 2.50 x 2.50 metros, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato
37	2	PZA	Suministro y colocación de portón de reja-acero de 3.57 metros lineales a 2.50 metros de altura, incluye materiales mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	Desde la firma del contrato hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato

LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SEIBEN LANDER, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
1	6.00	Pza	Suministro e instalación de mingitorio, incluye tubería hidráulica, descarga sanitaria, válvula temporizadora de agua, ranuras necesarias y adecuación de descarga sanitaria, y corrección de muro existente, tornillería, materiales, mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
2	29.00	Pza	Suministro y colocación de tapa y asiento para wc línea pesada en color blanco antiséptica y anti hongos. Incluye mano de obra herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
3	1.00	Serv.	Suministro y colocación de bomba sumergible de 1 hp para alimentación de tinacos en centro de convivencia incluye línea de alimentación para tinacos, en tubería hidráulica de pp-r de 1"1/4", herramienta, equipo, mano de obra.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
4	148.00	MI	Instalación de línea de alimentación de agua potable a casa de justicia, en tubería hidráulica de de pp - r de 1"1/4" incluye herramienta mano de obra, conexiones, equipo y todo lo necesario para un buen trabajo	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
5	2.00	Serv.	Modificaciones a trayectorias hidráulicas existentes, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para un buen funcionamiento, ranurados correcciones de muros o plafones, con sus respectivos procedimientos para un adecuado trabajo, equipo, herramienta. Etc.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
6	1.00	Salida	Suministro e instalación de línea hidráulica para riego de jardinería y incluye tubería de 3/4" válvula de nariz, conexiones, soportaría manguera de 50 ml y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.



**LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SEIBEN LANDER, S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
7	17.00	Pza	Suministro e instalación de lavabo con pedestal en color blanco, incluye, ranuras necesarias para adecuación de descarga sanitaria, mezcladora de agua cespól. Materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
8	3.00	Pza	Suministro y colocación de wc en color blanco modelo terracota incluye herrajes, juntas y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
9	16.00	Pza	Suministro y colocación de herrajes para tanque de wc corrección, incluye desmontaje y montaje de tanque, así como adecuada fijación de inodoro, con materiales de fijación adecuados, materiales y mano de obra.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
10	9.00	Pza	Suministro y colocación de mezcladora modelo similar al existente incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
11	1.00	Pza	Suministro y adecuación de línea de llenado de cisterna a tinacos del centro de convivencia, incluye, válvulas flotador maniobras en piso corrección de fuga de agua, maniobra de piso y todo lo necesario para su adecuada corrección.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
12	96.00	MI	Suministro, tendido, colocación y adecuación de tubería de 8" en polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado con doble pared, bajo norma AASHTO, para descargas de agua pluvial incluye inserciones de 4", acarreo y maniobras necesarias para una adecuada instalación.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
13	2,730.00	M2	Limpieza general del lugar durante el tiempo que se ejecuten los trabajos y al finalizar los mismos.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
<b>Bloque 2.- Cancelería de aluminio</b>					
14	104.43	M2	Adecuación de muro de tabla roca, corte y corrección, incluye, el suministro de materiales, perfiles acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, y lo necesario para un adecuado trabajo.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
15	45.00	M2	Suministro y colocación de falso plafón en tabla roca incluye materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
16	27.00	ML	Suministro y colocación de relleno para corrección de pisos en trayectorias de recorte de muros falsos, incluye materiales, herramienta, aditivos, acarreo y todo lo necesario para su buena colocación	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
17	4,237.50	M2	Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable en muros y plafones incluye equipo herramienta mano de obra y todo lo necesario	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.



LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SEIBEN LANDER, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
18	247.89	ML	Reparación de falso plafón a base de tabla roca en uniones y traslapes que fue retirado para el montaje de líneas eléctricas y de datos para instalaciones especiales. Incluye materiales mano de obra, incluye herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su corrección.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
19	5.04	M2	Retiro de cancelería de madera de 2.10 incluye desmontaje de marcos, chambranas y corrección de de muro, herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
20	25.35	M2	Suministro y habilitado de refuerzos en cancelería de aluminio de 3" con perfiles de aluminio de 3", incluye desmontaje de la cristalería y cancelería existente, recorte de cristales, y reinstalación de la cancelería modificada, viníles, felpas, incluye maniobras, herramienta equipo y todo lo necesario para garantizar la estabilidad del cancel.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
21	9.87	M2	Suministro y colocación de ventana para atención al público en aluminio blanco de 3" vidrio claro de 6 mm, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye una corredera y fijo a lo ancho de espacio, con 20 cm libres en diferentes medidas a una altura de 1.10 metros (4 piezas )	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
22	59.00	M2	Suministro y colocación de fijos en aluminio blanco en tres pulgadas con vidrio de 6 milímetros, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye material, herramienta y equipo. Diferentes medidas	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
23	30.55	M2	Suministro y colocación de puertas con pivote chapa en aluminio blanco en 3 pulgadas, vidrio claro de 6 mm, incluye herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (módulos de puertas en diferentes medidas)	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
24	5.00	SERV	Suministro y habilitado de refuerzo para puertas, a base de perfiles ligeros de acero al carbón, para soporte de cancelería de aluminio, incluye ranurado de falso plafón, corrección de falso plafón, equipo, herramienta maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
25	154.10	ML	Suministro y colocación de película satinada sobre vidrio por lo ancho del cancel con un desarrollo de 20 centímetros de ancho, incluye materiales, equipo mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
26	23.00	SAL	Suministro y adecuación de salida eléctrica existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
27	8.00	SAL	Suministro y adecuación de salida de voz y datos existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
28	10.00	SAL	Suministro, instalación y colocación de contactos regulados a 110 v incluye ducto, cableado, con un desarrollo de 15 ml, herraje y equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11	Durante la vigencia del contrato defectos y



LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SEIBEN LANDER , S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	PERIODO DE GARANTÍA
			ejecución	de mayo del 2022.	vicios ocultos.
29	11.00	SAL	Suministro, y colocación de apagador especial para cancelería incluye conexión, revisión de circuito instalación, herramienta mano de obra equipo y todo lo necesario para una buena ejecución	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
30	3.00	SAL	Suministro y colocación de tierra física para aterrizar proceso de site, incluye conexiones, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una correcta ejecución, sin intervenir en el proceso de funcionamiento y proceso del site.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
31	4.00	SERV.	Acarreos, y retiro de desechos, productos de limpieza etc. Incluye mano de obra y materiales.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
<b>Bloque 3.- Zoclos</b>					
32	1,827.87	ML	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm color negro con adhesivo de alta resistencia incluye, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su colocación	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
33	408.30	ML	Suministro, junteado y corrección de fisuras en muros de mampostería a base de materiales finos, incluye apertura, limpieza y aplicación de material de sellado, herramienta, equipo y mano de obra	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
34	937.35	ML	Suministro, y junteo de sellador elástica en color blanco a base de polímeros, grado arquitectónico para juntar muros con piso de cerámica. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
35	765.50	ML	Suministro, y junteo con pasta en color blanco a base de polímeros y resinas, para juntar muros con plafones. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
<b>Bloque 4.- Reja exterior</b>					
36	172.26	ML	Suministro y colocación de reja acero en color blanco a una altura de 2.50 mts incluye postes de reja-acero, abrazaderas paneles de reja-acero de 2.50 x 2.50 metros, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.
37	2.00	PZA	Suministro y colocación de portón de reja-acero de 3.57 metros lineales a 2.50 metros de altura, incluye materiales mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	A partir del siguiente día hábil de formalización del contrato y hasta el 11 de mayo del 2022.	Durante la vigencia del contrato defectos y vicios ocultos.

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE DETERMINA PROCEDER CON LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LOS LICITANTES, ESTO SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN EN FORMA CUALITATIVA.----

-----  
**LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES:**-----  
 -----



NOMBRE DEL LICITANTE: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.					
PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pza	6.00	Suministro e instalación de mingitorio, incluye tubería hidráulica, descarga sanitaria, válvula temporizadora de agua, ranuras necesarias y adecuación de descarga sanitaria, y corrección de muro existente, tornillería, materiales, mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	\$4,783.20	\$28,699.20
2	Pza	29.00	Suministro y colocación de tapa y asiento para wc línea pesada en color blanco antiséptica y anti hongos. Incluye mano de obra herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento	\$486.00	\$14,094.00
3	Serv.	1.00	Suministro y colocación de bomba sumergible de 1 hp para alimentación de tinacos en centro de convivencia incluye línea de alimentación para tinacos, en tubería hidráulica de pp-r de 1"1/4", herramienta, equipo, mano de obra.	\$14,870.35	\$14,870.35
4	MI	148.00	Instalación de línea de alimentación de agua potable a casa de justicia, en tubería hidráulica de de pp - r de 1"1/4" incluye herramienta mano de obra, conexiones, equipo y todo lo necesario para un buen trabajo	877.53	129,874.59
5	Serv.	2.00	Modificaciones a trayectorias hidráulicas existentes, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para un buen funcionamiento, ranurados correcciones de muros o plafones, con sus respectivos procedimientos para un adecuado trabajo, equipo , herramienta. Etc.	\$10,961.60	\$21,923.20
6	Salida	1.00	Suministro e instalación de línea hidráulica para riego de jardinería y incluye tubería de 3/4" válvula de nariz, conexiones, soportaría manguera de 50 ml y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$3,975.90	\$3,975.90
7	Pza	17.00	Suministro e instalación de lavabo con pedestal en color blanco, incluye, ranuras necesarias para adecuación de descarga sanitaria, mezcladora de agua cespól. Materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$3,648.00	\$62,016.00
8	Pza	3.00	Suministro y colocación de wc en color blanco modelo terracota incluye herrajes, juntas y todo lo neceara para su buen funcionamiento.	\$2,050.00	\$6,150.00
9	Pza	16.00	Suministro y colocación de herrajes para tanque de wc corrección, incluye desmontaje y montaje de tanque, así como adecuada fijación de inodoro, con materiales de fijación adecuados, materiales y mano de obra.	\$675.00	\$10,800
10	Pza	9.00	Suministro y colocación de mezcladora modelo similar al existente incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento	\$789.60	\$7,106.40
11	Pza	1.00	Suministro y adecuación de línea de llenado de cisterna a tinacos del centro de convivencia, incluye, válvulas flotador maniobras en piso corrección de fuga de agua, maniobra de piso y todo lo necesario para su adecuada corrección.	\$2,900.00	\$2,900.00
12	MI	96.00	Suministro, tendido, colocación y adecuación de tubería de 8" en polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado con doble pared, bajo norma AASHTO, para descargas de agua pluvial incluye inserciones de 4", acarrees y maniobras necesarias para una adecuada instalación.	\$416.25	\$39,960.00



NOMBRE DEL LICITANTE: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.					
13	M2	2,730.00	Limpieza general del lugar durante el tiempo que se ejecuten los trabajos y al finalizar los mismos.	\$875	\$23,887.50
<b>Bloque 2.- Cancelería de aluminio</b>					
14	M2	104.43	Adecuación de muro de tabla roca, corte y corrección, incluye, el suministro de materiales, perfiles acarrees, mano de obra, herramienta, equipo, y lo necesario para un adecuado trabajo.	555.40	\$58,000.42
15	M2	45.00	Suministro y colocación de falso plafón en tabla roca incluye materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento	\$385.90	\$17,365.50
16	ML	27.00	. Suministro y colocación de relleno para corrección de pisos en trayectorias de recorte de muros falsos, incluye materiales, herramienta, aditivos, acarrees y todo lo necesario para su buena colocación	\$175.30	\$4,733.10
17	M2	4,237.50	Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable en muros y plafones incluye equipo herramienta mano de obra y todo lo necesario	\$87.80	\$372,052.50
18	ML	247.89	Reparación de falso plafón a base de tabla roca en uniones y traslapes que fue retirado para el montaje de líneas eléctricas y de datos para instalaciones especiales. Incluye materiales mano de obra, incluye herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su corrección.	\$65.76	\$16,301.25
19	M2	5.04	Retiro de cancelería de madera de 2.10 incluye desmontaje de marcos, chambranas y corrección de de muro, herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución	\$125.00	\$630.00
20	M2	25.35	Suministro y habilitado de refuerzos en cancelería de aluminio de 3" con perfiles de aluminio de 3", incluye desmontaje de la cristalería y cancelería existente, recorte de cristales, y reinstalación de la cancelería modificada, viniles, felpas, incluye maniobras, herramienta equipo y todo lo necesario para garantizar la estabilidad del cancel.	\$1,865.00	\$47,277.75
21	M2	9.87	Suministro y colocación de ventana para atención al público en aluminio blanco de 3" vidrio claro de 6 mm, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye una corredera y fijo a lo ancho de espacio, con 20 cm libres en diferentes medidas a una altura de 1.10 metros (4 piezas )	\$2,148.64	\$21,207.08
22	M2	59.00	Suministro y colocación de fijos en aluminio blanco en tres pulgadas con vidrio de 6 milímetros, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye material, herramienta y equipo. Diferentes medidas	\$2148.64	\$126,769.76
23	M2	30.55	Suministro y colocación de puertas con pivote chapa en aluminio blanco en 3 pulgadas, vidrio claro de 6 mm, incluye herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (módulos de puertas en diferentes medidas)	\$2148,64	\$65,640.95
24	SERV	5.00	Suministro y habilitado de refuerzo para puertas, a base de perfiles ligeros de acero al carbón, para soporte de cancelería de aluminio, incluye ranurado de falso plafón, corrección de falso plafón, equipo, herramienta maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	\$3,350.00	\$16,750.00
25	ML	154.10	Suministro y colocación de película satinada sobre vidrio por lo ancho del cancel con un desarrollo de 20 centímetros de ancho, incluye materiales, equipo	\$268.60	\$41,391.26



NOMBRE DEL LICITANTE: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.					
			mano de obra y todo lo necesario para su colocación.		
26	SAL	23.00	Suministro y adecuación de salida eléctrica existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento.	\$1,350.00	\$31,050.00
27	SAL	8.00	Suministro y adecuación de salida de voz y datos existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento	\$1,850.00	\$14,800.00
28	SAL	10.00	Suministro, instalación y colocación de contactos regulados a 110 v incluye ducto, cableado, con un desarrollo de 15 ml, herraje y equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$2,110.00	\$21,100.00
29	SAL	11.00	Suministro, y colocación de apagador especial para cancelería incluye conexión, revisión de circuito instalación, herramienta mano de obra equipo y todo lo necesario para una buena ejecución	\$435.21	\$4,787.31
30	SAL	3.00	Suministro y colocación de tierra física para aterrizar proceso de site, incluye conexiones, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una correcta ejecución, sin intervenir en el proceso de funcionamiento y proceso del site.	\$3,890.65	\$11,671.95
31	SERV.	4.00	Acarreos, y retiro de desechos, productos de limpieza etc. Incluye mano de obra y materiales.	\$800.00	\$3,200.00
<b>Bloque 3.- Zoclos</b>					
32	ML	1,827.87	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm color negro con adhesivo de alta resistencia incluye, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su colocación	\$38.51	\$70,395.84
33	ML	408.30	Suministro, junteado y corrección de fisuras en muros de mampostería a base de materiales finos, incluye apertura, limpieza y aplicación de material de sellado, herramienta, equipo y mano de obra	\$28.50	\$11,636.55
34	ML	937.35	Suministro, y junteo de sellador elástica en color blanco a base de polímeros, grado arquitectónico para juntar muros con piso de cerámica. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	\$39.10	\$36,650.39
35	ML	765.50	Suministro, y junteo con pasta en color blanco a base de polímeros y resinas, para juntar muros con plafones. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	\$28.27	\$21,640.69
<b>Bloque 4.- Reja exterior</b>					
36	ML	172.26	Suministro y colocación de reja acero en color blanco a una altura de 2.50 mts incluye postes de reja-acero, abrazaderas paneles de reja-acero de 2.50 x 2.50 metros, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	\$1,748.72	\$301,234.51
37	PZA	2.00	Suministro y colocación de portón de reja-acero de 3.57 metros lineales a 2.50 metros de altura, incluye materiales mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$15,915.01	\$31,830.02
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,714,369.24</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 274,299.08</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,988,668.32</b>



LICITANTE: EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.
1	6	Pza	Suministro e instalación de mingitorio, incluye tubería hidráulica, descarga sanitaria, válvula temporizadora de agua, ranuras necesarias y adecuación de descarga sanitaria, y corrección de muro existente, tornillería, materiales, mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	5,174.42	31,046.52
2	29	Pza	Suministro y colocación de tapa y asiento para wc línea pesada en color blanco antiséptica y anti hongos. Incluye mano de obra herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento	525.85	15,249.65
3	1	Serv.	Suministro y colocación de bomba sumergible de 1 hp para alimentación de tinacos en centro de convivencia incluye línea de alimentación para tinacos, en tubería hidráulica de pp-r de 1"1/4", herramienta, equipo, mano de obra.	16,803.03	16,803.03
4	148	MI	Instalación de línea de alimentación de agua potable a casa de justicia, en tubería hidráulica de de pp - r de 1"1/4" incluye herramienta mano de obra, conexiones, equipo y todo lo necesario para un buen trabajo	949.46	140,520.08
5	2	Serv.	Modificaciones a trayectorias hidráulicas existentes, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para un buen funcionamiento, ranurados correcciones de muros o plafones, con sus respectivos procedimientos para un adecuado trabajo, equipo, herramienta. Etc.	11,860.45	23,720.90
6	1	Salida	Suministro e instalación de línea hidráulica para riego de jardinería y incluye tubería de 3/4" válvula de nariz, conexiones, soportaría manguera de 50 ml y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,301.92	4,301.92
7	17	Pza	Suministro e instalación de lavabo con pedestal en color blanco, incluye, ranuras necesarias para adecuación de descarga sanitaria, mezcladora de agua cespól. Materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,947.14	67,101.38
8	3	Pza	Suministro y colocación de wc en color blanco modelo terracota incluye herrajes, juntas y todo lo neceara para su buen funcionamiento.	2,218.10	6,654.30
9	16	Pza	Suministro y colocación de herrajes para tanque de wc corrección, incluye desmontaje y montaje de tanque, así como adecuada fijación de inodoro, con materiales de fijación adecuados, materiales y mano de obra.	730.35	11,685.60
10	9	Pza	Suministro y colocación de mezcladora modelo similar al existente incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento	854.35	7,689.15
11	1	Pza	Suministro y adecuación de línea de llenado de cisterna a tinacos del centro de convivencia, incluye, válvulas flotador maniobras en piso corrección de fuga de agua, maniobra de piso y todo lo necesario para su adecuada corrección.	3,137.80	3,137.80
12	96	MI	Suministro, tendido, colocación y adecuación de tubería de 8" en polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado con doble pared, bajo norma AASHTO, para descargas de agua pluvial incluye inserciones de 4", acarreo y maniobras necesarias para una adecuada instalación.	450.38	43,236.48
13	2,730	M2	Limpieza general del lugar durante el tiempo que se	9.47	25,853.10



**LICITANTE: EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.**

LICITANTE: EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.					
			ejecuten los trabajos y al finalizar los mismos.		
14	104.43	M2	Adecuación de muro de tabla roca, corte y corrección, incluye, el suministro de materiales, perfiles acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, y lo necesario para un adecuado trabajo.	600.94	62,756.16
15	45	M2	Suministro y colocación de falso plafón en tabla roca incluye materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	417.54	18,789.30
16	27	ML	Suministro y colocación de relleno para corrección de pisos en trayectorias de recorte de muros falsos, incluye materiales, herramienta, aditivos, acarreo y todo lo necesario para su buena colocación	189.67	5,121.09
17	4,237.50	M2	Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable en muros y plafones incluye equipo herramienta mano de obra y todo lo necesario	95.00	402,562.50
18	247.89	ML	Reparación de falso plafón a base de tabla roca en uniones y traslapes que fue retirado para el montaje de líneas eléctricas y de datos para instalaciones especiales. Incluye materiales mano de obra, incluye herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su corrección.	71.15	17,637.37
19	5.04	M2	Retiro de cancelería de madera de 2.10 incluye desmontaje de marcos, chambranas y corrección de muro, herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución	135.25	681.66
20	25.35	M2	Suministro y habilitado de refuerzos en cancelería de aluminio de 3" con perfiles de aluminio de 3", incluye desmontaje de la cristalería y cancelería existente, recorte de cristales, y reinstalación de la cancelería modificada, viníles, felpas, incluye maniobras, herramienta equipo y todo lo necesario para garantizar la estabilidad del cancel.	2,017.93	51,154.53
21	9.87	M2	Suministro y colocación de ventana para atención al público en aluminio blanco de 3" vidrio claro de 6 mm, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye una corredera y fijo a lo ancho de espacio, con 20 cm libres en diferentes medidas a una altura de 1.10 metros (4 piezas )	2,324.84	22,946.17
22	59	M2	Suministro y colocación de fijos en aluminio blanco en tres pulgadas con vidrio de 6 milímetros, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye material, herramienta y equipo. Diferentes medidas	2,324.83	137,164.97
23	30.55	M2	Suministro y colocación de puertas con pivote chapa en aluminio blanco en 3 pulgadas, vidrio claro de 6 mm, incluye herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (módulos de puertas en diferentes medidas)	2,324.83	71,023.56
24	5	SERV	Suministro y habilitado de refuerzo para puertas, a base de perfiles ligeros de acero al carbón, para soporte de cancelería de aluminio, incluye ranurado de falso plafón, corrección de falso plafón, equipo, herramienta maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	3,624.70	18,123.50
25	154.1	ML	Suministro y colocación de película satinada sobre vidrio por lo ancho del cancel con un desarrollo de 20 centímetros de ancho, incluye materiales, equipo mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	290.63	44,786.08
26	23	SAL	Suministro y adecuación de salida eléctrica existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento.	1,460.70	33,596.10



LICITANTE: EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.					
27	8	SAL	Suministro y adecuación de salida de voz y datos existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento	2,001.70	16,013.60
28	10	SAL	Suministro, instalación y colocación de contactos regulados a 110 v incluye ducto, cableado, con un desarrollo de 15 ml, herraje y equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	2,283.02	22,830.20
29	11	SAL	Suministro, y colocación de apagador especial para cancelería incluye conexión, revisión de circuito instalación, herramienta mano de obra equipo y todo lo necesario para una buena ejecución	470.89	5,179.79
30	3	SAL	Suministro y colocación de tierra física para aterrizar proceso de site, incluye conexiones, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una correcta ejecución, sin intervenir en el proceso de funcionamiento y proceso del site.	4,209.68	12,629.04
31	4	SERV.	Acarreos, y retiro de desechos, productos de limpieza etc. Incluye mano de obra y materiales.	865.60	3,462.40
32	1,827.87	ML	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm color negro con adhesivo de alta resistencia incluye, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su colocación	41.67	76,167.34
33	408.3	ML	Suministro, junteado y corrección de fisuras en muros de mampostería a base de materiales finos, incluye apertura, limpieza y aplicación de material de sellado, herramienta, equipo y mano de obra	30.84	12,591.97
34	937.35	ML	Suministro, y junteo de sellador elástica en color blanco a base de polímeros, grado arquitectónico para juntar muros con piso de cerámica. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	42.31	39,659.28
35	765.5	ML	Suministro, y junteo con pasta en color blanco a base de polímeros y resinas, para juntar muros con plafones. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	30.59	23,416.65
36	172.26	ML	Suministro y colocación de reja acero en color blanco a una altura de 2.50 mts incluye postes de reja-acero, abrazaderas paneles de reja-acero de 2.50 x 2.50 metros, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	1,892.12	325,936.59
37	2	PZA	Suministro y colocación de portón de reja-acero de 3.57 metros lineales a 2.50 metros de altura, incluye materiales mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	17,133.00	34,266.18
<b>IMPORTE CON LETRA</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,855,495.94</b>
<b>DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS</b>				<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 296,879.35</b>
<b>29/100 M.N.</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,152,375.29</b>

LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	6	Pza	Suministro e instalación de mingitorio, incluye tubería hidráulica, descarga sanitaria, válvula temporizadora de agua, ranuras necesarias y adecuación de descarga sanitaria, y	5,405.02	32,430.12



**LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V.**

			corrección de muro existente, tornillería, materiales, mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.		
2	29	Pza	Suministro y colocación de tapa y asiento para wc línea pesada en color blanco antiséptica y anti hongos. Incluye mano de obra herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento	549.18	15,926.22
3	1	Serv.	Suministro y colocación de bomba sumergible de 1 hp para alimentación de tinacos en centro de convivencia incluye línea de alimentación para tinacos, en tubería hidráulica de pp-r de 1"1/4", herramienta, equipo, mano de obra.	16,803.03	16,803.03
4	148	MI	Instalación de línea de alimentación de agua potable a casa de justicia, en tubería hidráulica de de pp - r de 1"1/4" incluye herramienta mano de obra, conexiones, equipo y todo lo necesario para un buen trabajo	991.58	146,753.84
5	2	Serv.	Modificaciones a trayectorias hidráulicas existentes, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para un buen funcionamiento, ranurados correcciones de muros o plafones, con sus respectivos procedimientos para un adecuado trabajo, equipo , herramienta. Etc.	12,386.61	24,773.22
6	1	Salida	Suministro e instalación de línea hidráulica para riego de jardinería y incluye tubería de 3/4" válvula de nariz, conexiones, soportaría manguera de 50 ml y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,492.77	4,492.77
7	17	Pza	Suministro e instalación de lavabo con pedestal en color blanco, incluye, ranuras necesarias para adecuación de descarga sanitaria, mezcladora de agua cespól. Materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,122.24	70,078.08
8	3	Pza	Suministro y colocación de wc en color blanco modelo terracota incluye herrajes, juntas y todo lo neceara para su buen funcionamiento.	2,326.50	6,979.50
9	16	Pza	Suministro y colocación de herrajes para tanque de wc corrección, incluye desmontaje y montaje de tanque, así como adecuada fijación de inodoro, con materiales de fijación adecuados, materiales y mano de obra.	762.65	12,202.40
10	9	Pza	Suministro y colocación de mezcladora modelo similar al existente incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento	892.25	8,030.25
11	1	Pza	Suministro y adecuación de línea de llenado de cisterna a tinacos del centro de convivencia, incluye, válvulas flotador maniobras en piso corrección de fuga de agua, maniobra de piso y todo lo necesario para su adecuada corrección.	3,227.00	3,227.00
12	96	MI	Suministro, tendido, colocación y adecuación de tubería de 8" en polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado con doble pared, bajo norma AASHTO, para descargas de agua pluvial incluye inserciones de 4", acarreo y maniobras necesarias para una adecuada instalación.	470.36	45,154.56
13	2,730	M2	Limpieza general del lugar durante el tiempo que se ejecuten los trabajos y al finalizar los mismos.	9.89	26,999.70
14	104.43	M2	Adecuación de muro de tabla roca, corte y corrección, incluye, el suministro de materiales, perfiles acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, y lo necesario para un adecuado trabajo.	627.60	65,540.27
15	45	M2	Suministro y colocación de falso plafón en tabla roca incluye materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	436.07	19,623.15
16	27	ML	Suministro y colocación de relleno para corrección de pisos en trayectorias de recorte de muros falsos, incluye materiales, herramienta, aditivos, acarreo y todo lo necesario para su buena colocación	198.09	5,348.43



LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V.					
17	4,237.50	M2	Suministro y aplicación de pintura vinilica mate lavable en muros y plafones incluye equipo herramienta mano de obra y todo lo necesario	99.21	420,402.38
18	247.89	ML	Reparación de falso plafón a base de tabla roca en uniones y traslapes que fue retirado para el montaje de líneas eléctricas y de datos para instalaciones especiales. Incluye materiales mano de obra, incluye herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su corrección.	74.32	18,423.18
19	5.04	M2	Retiro de cancelería de madera de 2.10 incluye desmontaje de marcos, chambranas y corrección de de muro, herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución	141.25	711.90
20	25.35	M2	Suministro y habilitado de refuerzos en cancelería de aluminio de 3" con perfiles de aluminio de 3", incluye desmontaje de la cristalería y cancelería existente, recorte de cristales, y reinstalación de la cancelería modificada, viníles, felpas, incluye maniobras, herramienta equipo y todo lo necesario para garantizar la estabilidad del cancel.	2,107.45	53,423.86
21	9.87	M2	Suministro y colocación de ventana para atención al público en aluminio blanco de 3" vidrio claro de 6 mm, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye una corredera y fijo a lo ancho de espacio, con 20 cm libres en diferentes medidas a una altura de 1.10 metros (4 piezas )	9.87	97.42
22	59	M2	Suministro y colocación de fijos en aluminio blanco en tres pulgadas con vidrio de 6 milímetros, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye material, herramienta y equipo. Diferentes medidas	2,427.96	143,249.64
23	30.55	M2	Suministro y colocación de puertas con pivote chapa en aluminio blanco en 3 pulgadas, vidrio claro de 6 mm, incluye herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (módulos de puertas en diferentes medidas)	2,427.96	74,174.18
24	5	SERV	Suministro y habilitado de refuerzo para puertas, a base de perfiles ligeros de acero al carbón, para soporte de cancelería de aluminio, incluye ranurado de falso plafón, corrección de falso plafón, equipo, herramienta maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	3,785.50	18,927.50
25	154.1	ML	Suministro y colocación de película satinada sobre vidrio por lo ancho del cancel con un desarrollo de 20 centímetros de ancho, incluye materiales, equipo mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	303.52	46,772.43
26	23	SAL	Suministro y adecuación de salida eléctrica existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento.	1,525.50	35,086.50
27	8	SAL	Suministro y adecuación de salida de voz y datos existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento	2,090.50	16,724.00
28	10	SAL	Suministro, instalación y colocación de contactos regulados a 110 v incluye ducto, cableado, con un desarrollo de 15 ml, herraje y equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	2,384.30	23,843.00
29	11	SAL	Suministro, y colocación de apagador especial para canceleria incluye conexión, revisión de circuito instalación, herramienta mano de obra equipo y todo lo necesario para una buena ejecución	492.78	5,420.58
30	3	SAL	Suministro y colocación de tierra física para aterrizar proceso de site, incluye conexiones, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una correcta ejecución, sin intervenir en el proceso de funcionamiento y proceso del site.	4,396.43	13,189.29
31	4	SERV.	Acarreos, y retiro de desechos, productos de limpieza etc.		



LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER, S.A. DE C.V.					
			Incluye mano de obra y materiales.	904.00	3,616.00
32	1,827.87	ML	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm color negro con adhesivo de alta resistencia incluye, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su colocación	43.52	79,548.90
33	408.3	ML	Suministro, junteado y corrección de fisuras en muros de mampostería a base de materiales finos, incluye apertura, limpieza y aplicación de material de sellado, herramienta, equipo y mano de obra	32.32	13,196.26
34	937.35	ML	Suministro, y junteo de sellador elástica en color blanco a base de polímeros, grado arquitectónico para juntar muros con piso de cerámica. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	44.10	41,337.14
35	765.5	ML	Suministro, y junteo con pasta en color blanco a base de polímeros y resinas, para juntar muros con plafones. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	31.66	24,235.73
36	172.26	ML	Suministro y colocación de reja acero en color blanco a una altura de 2.50 mts incluye postes de reja-acero, abrazaderas paneles de reja-acero de 2.50 x 2.50 metros, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	1,958.57	337,383.27
37	2	PZA	Suministro y colocación de portón de reja-acero de 3.57 metros lineales a 2.50 metros de altura, incluye materiales mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	17,983.95	35,967.90
DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 58/100 M.N.				<b>SUBTOTAL</b>	1,910,093.60
				<b>I.V.A.</b>	305614.976
				<b>TOTAL</b>	2,215,708.58

**NOTAS GENERALES:** -----

**A) TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES SE RECIBE PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS CUALITATIVO, CUYO RESULTADO SE DARÁ A CONOCER EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO.**-----

**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:** LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **11:32 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y ENTREGÁNDOSE A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE, COMO MUESTRA DE APROBACIÓN.-----

POR EL COMITÉ

C. ISRAEL CUAPIÓ CORTÉS

C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ



POR LA CONTRALORÍA


POR LA UNIDAD SOLICITANTE

  
C. ERASMO PEDRAZA CASTILLO


  
C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ

POR LOS LICITANTES

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.

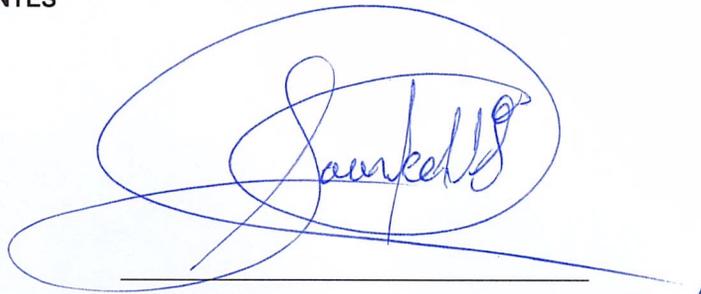

EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.

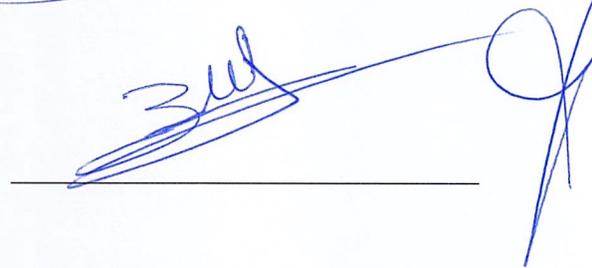

GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SEIBEN LANDER, S.A. DE C.V.



----- FIN DE TEXTO -----

